MODERNISERINGSSTYRELSEN

Bilag 1 – Tidsplan

Til Kontrakt om anskaffelse, udvikling, drift og vedligehold af et fællesstatsligt tilskudsadministrationssystem

UDKAST

VEJLEDNING TIL TILBUDSAFGIVELSE

0.1 Generelt

Dette afsnit 0 indeholder en vejledning til Tilbudsgiver til brug for Tilbudsgivers afgivelse af tilbud. Vejledningen slettes før kontrakts indgåelse. For supplerende vejledning, herunder navnlig vedrørende de forskellige kravtyper, henvises til dokumentet "Generel vejledning til tilbudsgiverne".
Yderligere vejledning i dette bilag, jf. punkt 3.1 og 3.2 er markeret med [*kursiv og gul overstregning*].
Yderligere vejledende tekst er ligeledes til leverandørens orientering og slettes før kontrakts indgåelse.

0.2 Kravtyper i dette bilag

Dette bilag indeholder (K).
Bilaget indeholder nummererede afsnit. Kravene til Leverandørens ydelser er beskrevet i brødtekst under de nummererede afsnit. Hvert nummereret afsnit slutter med en angivelse af kravtypen, eks. (K). Alt tekst i en given brødtekst er en del af det pågældende krav, herunder opstillinger med punktlister, tabeller mv.
Hvor et nummereret afsnit indeholder nummererede underafsnit angives kravtypen på de enkelte underafsnit. Det overordnede afsnit slutter i givet fald med en angivelse af (N/A), da det overordnede afsnit ikke har en selvstændig kravtype.

0.3 Tilbudsgivers færdiggørelse af bilaget og beskrivelse af løsningen

Tilbudsgiver skal færdiggøre bilaget ved at udfylde tabel 1 og 2 i punkt 3 i overensstemmelse med vejledningerne angivet deri.

Tilbudsgiver skal endvidere udfylde nedenstående bilag i overensstemmelse med vejledningerne angivet deri:
Bilag 1.1 (Uddybende beskrivelse af aktiviteter i afklaringsfasen for Initial leverance)
Bilag 1.2 (Detaljeret tids- og aktivitetsplan for Initial leverance)
Bilag 1.3 (Overordnet tidsplan for Delleverancer)

UDKAST

INDHOLDSFORTEGNELSE

0.1 GENERELT 2
0.2 KRAVTYPER I DETTE BILAG 2
0.3 TILBUDSGIVERS FÆRDIGGØRELSE AF BILAGET OG BESKRIVELSE AF LØSNINGEN 2

1 INDLEDNING (N/A) 4

1.1 HOVEDTIDSPLAN OG UNDERBILAG (K) 4
1.2 LEVERANCENS OVERORDNEDE OPDELING OG FORLØB (K) 4
1.3 KUNDENS FORVENTNING TIL DEN OVERORDNEDE TIDSPLAN (K) 4

2 BESKRIVELSE AF FASER FOR DELLEVERANCER (N/A) 6

2.1 INDLEDNING (K) 6
2.2 AFKLARINGSFASE (N/A) 6
2.2.1 Formål og igangsættelse (K) 6
2.2.2 Afklaringsfasens gennemførelse (K) 7
2.2.3 Deltagelse i afklaringsfasen (K) 7
2.2.4 Præciseringer og suppleringer af Kontrakten (K) 7
2.2.5 Revision af prøvestrategi (K) 7
2.2.6 Afklaringsrapport (K) 7
2.2.7 Godkendelse af afklaringsfasen og dennes afslutning (K) 8
2.3 UDVIKLINGSFASE (N/A) 8
2.3.1 Formål og igangsættelse (K) 8
2.3.2 Analyse, Design, Udvikling (K) 8
2.3.3 Etablering af miljøer (K) 8
2.3.4 Afslutning af udviklingsfasen (K) 8
2.4 AFPRØVNINGSFASE (IBRUGTAGNING OG OVERTAGELSE) (N/A) 9
2.4.1 Formål og igangsættelse (K) 9
2.4.2 Afslutning af afprøvningsfase (K) 9
2.5 IMPLEMENTERINGSFASE (N/A) 9
2.5.1 Formål og igangsættelse (K) 9
2.5.2 Fasens varighed (K) 9
2.5.3 Fasens varighed (K) 9
2.6 MODIFIKATIONER TIL FASERNE FOR DE EFTERFØLGENDE DELLEVERANCER (N/A) 9
2.6.1 Indledning (K) 9
2.6.2 Afklaringsfasen (K) 10
2.6.3 Udvikling (K) 10

3 HOVEDTIDSPLAN FOR LEVERANCEN (N/A) 11

3.1 HOVEDTIDSPLAN FOR INITIAL LEVERANCE (K) 11
3.2 HOVEDTIDSPLAN FOR EFTERFØLGENDE DELLEVERANCER (K) 12

4 OPTIONER 13

UDKAST

1 INDLEDNING (N/A)

1.1 Hovedtidsplan og underbilag (K)

Dette Bilag 1 indeholder på tidspunktet for kontraktindgåelsen hovedtidsplanen for gennemførelse af Leverancen, hvor faser, hoved- og betalingsmilepæle, aktiviteter mv. er afspejlet.

1.2 Leverancens overordnede opdeling og forløb (K)

Leveranceprojektet er opdelt i et antal Delleverancer bestående af en Initial Leverance (MVP) og et antal Efterfølgende Delleverancer.

Det nærmere indhold af de enkelte Delleverancer er specificeret i Bilag 3.1 (Kundens Kravspecifikation). Tidspunktet for, hvornår de enkelte dele af Leverancen skal tilvejebringes i de pågældende Delleverancer samt hvilke Myndigheder, der skal tilkobles Systemet som led i de enkelte Delleverancer, er beskrevet i dette Bilag 1 (inklusive underbilag).

Overordnet vedrører den Initiale Leverance udvikling og implementering af Systemet hos fem (5) Pilotmyndigheder (Bølge 1-Myndigheder) for hvem der opsættes et begrænset antal puljer i Systemet (som nærmere aftalt i afklaringsfasen). Delleverance 2 vedrører udvikling af yderligere funktionalitet i Systemet med henblik på, at de fem (5) Pilotmyndigheder kan opsætte alle puljer i Systemet. Delleverance 3 og 4 vedrører udvikling af yderligere funktionalitet i Systemet med henblik på at Bølge 2-Myndigheder og Bølge 3-Myndigheder kan opsætte alle puljer i systemet.

Hver Delleverance udføres som et faseopdelt projekt, hvor der gennemføres en afklarings-, udviklings-, afprøvnings-, og implementeringsfase for hver Delleverance. Hver Delleverance overtages af Kunden ved bestået Ibrugtagningsprøve, og afsluttes med en bestået Driftsprøve. Der sker således løbende overtagelse af Leverancen for hver Delleverance, og den samlede Leverance er endeligt overtaget ved Kundens godkendelse af Driftsprøven for den sidste Delleverance.

Videreudvikling af Systemet udenfor Leveranceprojektet, herunder tilkobling af yderligere Myndigheder til Systemet samt datamigrering, bestilles og leveres som Projekter på vilkårene beskrevet i Kontraktens punkt 17 (Videreudvikling udenfor Leverancen (Nye Projekter)), bilag 8 (Projektvilkår) og bilag 12 (Prøver), og er ikke indeholdt i dette bilag.


Systemet skal udvikles efter Leverandørens udviklingsmetode og projektledelsesmetode, jf. nærmere Kontraktens punkt 6 (Udviklingsmetode) samt Bilag 10.3 (Leverandørens Metoder), og skal gennemføres på en måde, der understøtter omfanget af Kundens ressourcer og deltagelse i forbindelse med Kontraktens gennemførelse som nærmere beskrevet i Bilag 10 (Samarbejdsorganisation og Rapportering).

1.3 Kundens forventning til den overordnede tidsplan (K)

I Figur 1 fremgår Kundens forventning til den overordnede tidsplan for Leverancen samt hvornår de forskellige Myndigheder forventes at skulle tage Systemet i brug ved henholdsvis den Initiale Leverance (MVP), en Efterfølgende Delleverance eller ved et nyt Projekt.

UDKAST

Figur 1: Kundens forventning til den overordnede tidsplan

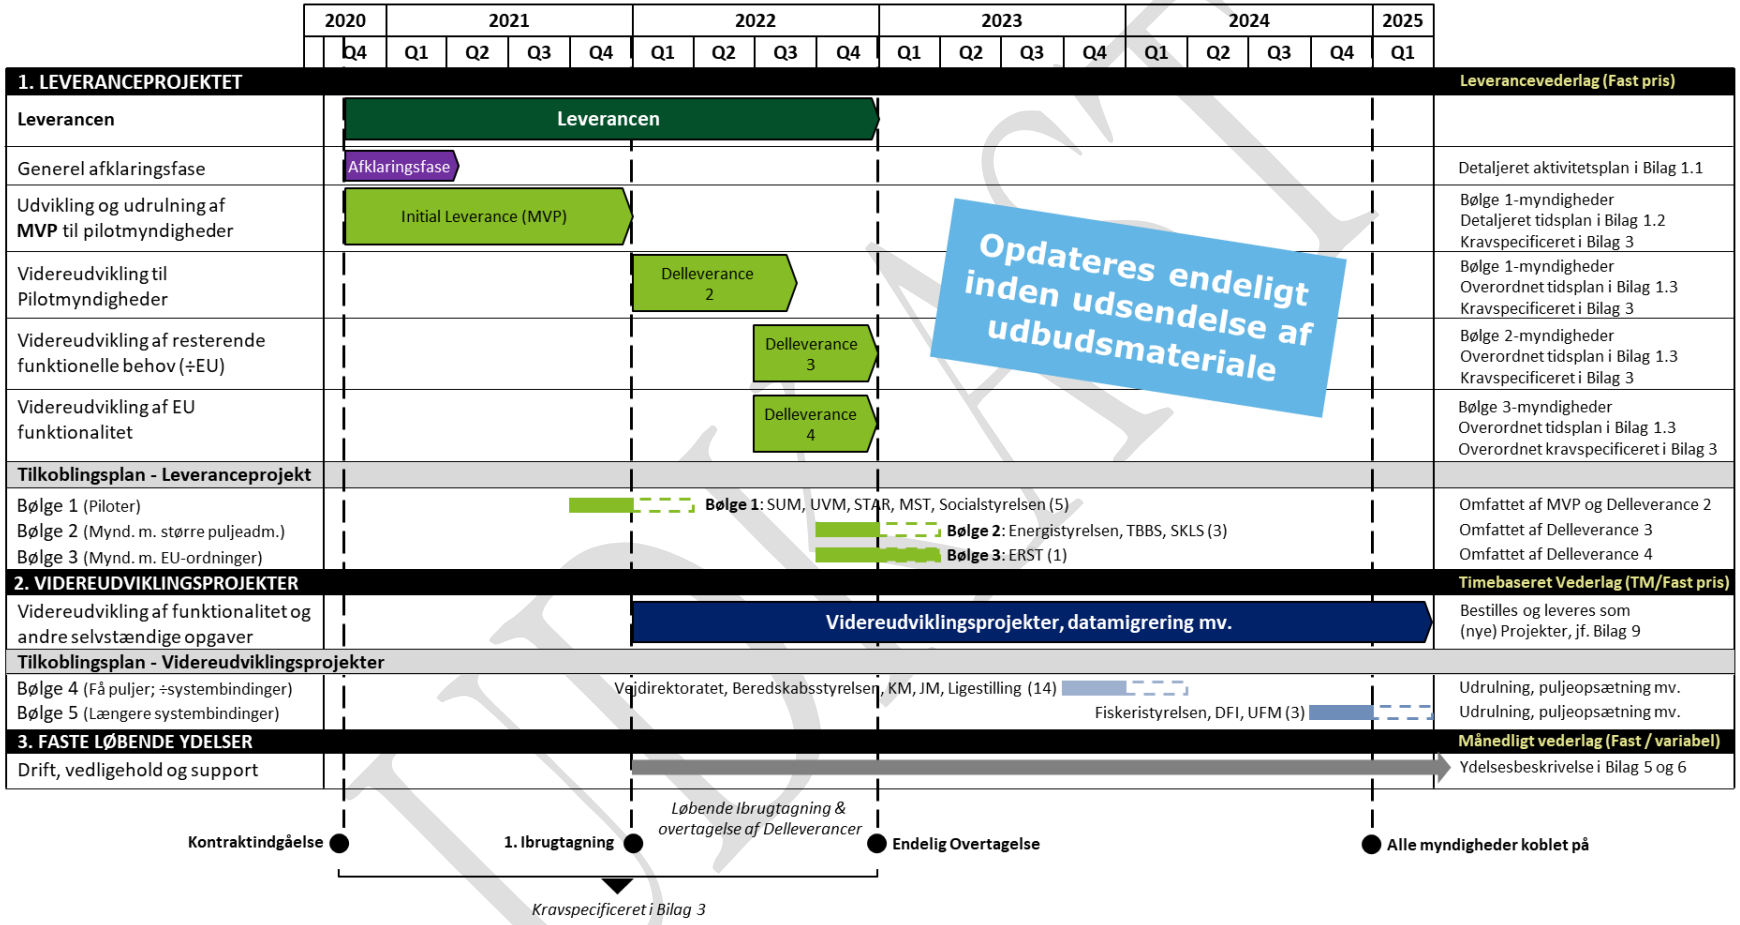


2 BESKRIVELSE AF FASER FOR DELLEVERANCER (N/A)

2.1 Indledning (K)

Hver Delleverance gennemføres i følgende faser (også illustreret i Figur 2 nedenfor):

- **Afklaringsfase**, der afsluttes med Kundens godkendelse af den endelige afklaringsrapport, inklusive opdaterede tidsplaner og eventuelt revideret Leverancebeskrivelse og øvrige Ændringer til Kontrakten, jf. nærmere punkt 2.2 nedenfor samt Kontraktens punkt 7.2;
- **Udviklingsfase** (analyse, design, udvikling), der afsluttes med Kundens godkendelse af bestået Funktionsprøve jf. nærmere punkt 2.3 nedenfor samt Kontraktens punkt 7.3;
- **Afprøvningsfase**, der afsluttes med overtagelse ved Kundens godkendelse af bestået Ibrugtagningsprøve, jf. nærmere punkt 2.4 nedenfor samt Kontraktens punkt 7.4;
- **Implementeringsfase**, der afsluttes med Kundens godkendelse af bestået Driftsprøve, jf. nærmere punkt 2.5 nedenfor samt Kontraktens punkt 7.5.

Figur 2: Faser for hver Delleverance (generisk)

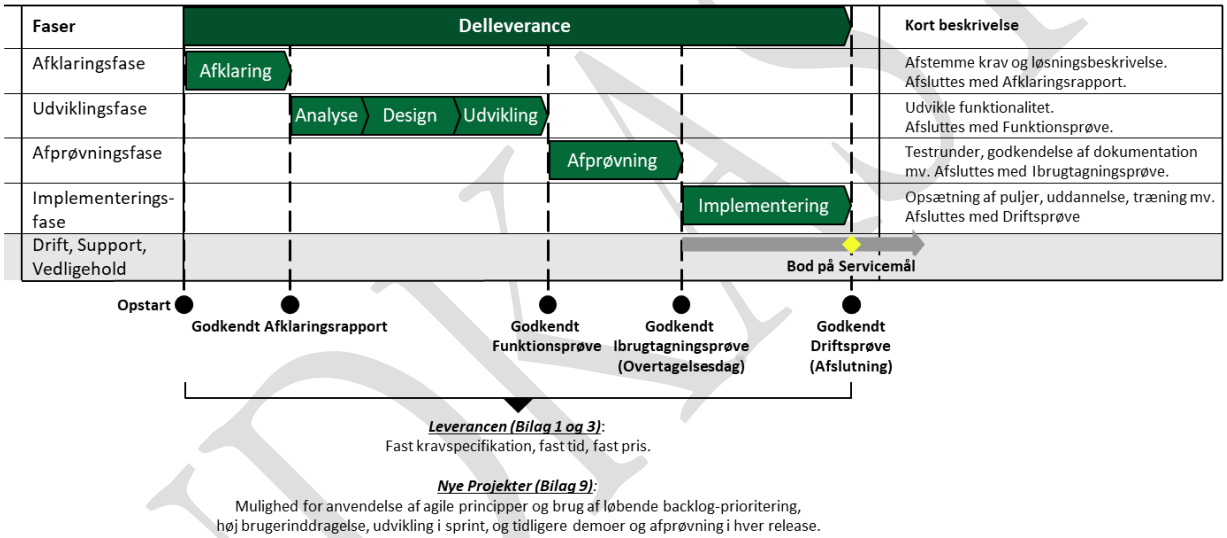

Punkt 2.2-2.5 nedenfor gælder fuldt ud for den Initiale Leverance (MVP) og gælder herefter for de Efterfølgende Delleverancer med de modifikationer, der fremgår af punkt 2.6.

2.2 Afklaringsfase (N/A)

2.2.1 Formål og igangsættelse (K)

Afklaringsfasen igangsættes på det tidspunkt, der fremgår af den gældende tidsplan for den pågældende Delleverance, herunder hovedtidsplanen i punkt 3. Afklaringsfasen har til formål, at Leverandøren opnår nærmere indsigt i Kundens behov, forretningsgange og it-miljø, og at Kunden opnår nærmere indsigt i Leverandørens Løsningsbeskrivelse (herunder i forhold til Systemets funktioner og muligheder) med henblik på at foretage en yderligere konkretisering af Delleverancens indhold og formål. Afklaringsfasen har endvidere til formål, at tilrettelægge det videre forløb for levering af Delleverancen.

UDKAST

2.2.2 Afklaringsfasens gennemførelse (K)

Afklaringsfasen gennemføres som et samarbejde på Leverandørens initiativ, hvor Parterne gennemgår Bilag 3 (Leverancebeskrivelsen) med henblik på at vurdere det nærmere indhold af Kundens behov, og hvorledes behovet opfyldes samt forudsætninger knyttet hertil. Endvidere foretages en vurdering af, om der ved en ændring i Kravspecifikationen (jf. Bilag 3.1) og/eller Løsningsbeskrivelsen (jf. Bilag 3.2)) kan opnås en mere hensigtsmæssig leverance under hensyntagen til Kundens behov og Leverandørens muligheder. På grundlag heraf skal Leverandøren fremkomme med eventuelle forslag til præciseringer og suppleringer af Leverancebeskrivelsen og evt. øvrige bilag.

2.2.3 Deltagelse i afklaringsfasen (K)

Parterne skal yde en betydelig indsats i afklaringsfasen, herunder deltage i analyser, workshops og demonstrationer mv. Kundens aktiviteter i afklaringsfasen for den Initiale Leverance er på tidspunktet for Kontraktens indgåelse beskrevet i Bilag 1.1. Kundens ressourcer til denne medvirken fremgår overordnet af Bilag 10 (Samarbejdsorganisation og Rapportering).

2.2.4 Præciseringer og suppleringer af Kontrakten (K)

I det omfang Parterne foreløbig opnår enighed om præciseringer og suppleringer til Kontraktens bilag, skal Leverandøren udarbejde udkast herom og skal i den forbindelse tage stilling til, i hvilket omfang disse præciseringer og suppleringer vil få konsekvens for tidsplan, vederlag til Leverandøren og eventuelle andre vilkår i Kontrakten. Præciseringer og suppleringer, der foretages under afklaringsfasen, kan alene foretages indenfor rammerne af udbudsloven. Enhver Ændring i Leverancebeskrivelsen og Kontrakten i øvrigt skal kunne dokumenteres med fuld sporbarhed.

2.2.5 Revision af prøvestrategi (K)

I afklaringsfasen tager Leverandøren initiativ til, at prøvestrategien gennemarbejdes i samarbejde med Kunden. Dette arbejde skal resultere i en af Leverandøren udarbejdet revideret prøvestrategi, der skal leveres til Kunden samtidig med forslag til den reviderede Leverancebeskrivelse.

2.2.6 Afklaringsrapport (K)

Leverandøren skal udarbejde en rapport, der beskriver resultater og konsekvenser af de gennemførte aktiviteter i afklaringsfasen.

Afklaringsrapporten skal som minimum indeholde:

- Beskrivelse af hvilke **aktiviteter** der er gennemført, jf. bilag 1.1.
- En opdateret detaljeret **tids- og aktivitetsplan** for den Initiale Leverance (jf. Bilag 1.2) og de Efterfølgende Delleverancer (jf. Bilag 1.3) samt en beskrivelse af eventuelle konsekvenser for den relevante hovedtidsplan i punkt 3.
- En opdateret **Leverancebeskrivelse** (jf. Bilag 3), herunder eventuelle ændringer i Leverandørens Løsningsbeskrivelse (jf. Bilag 3.2) og revideret prøvestrategi (jf. Bilag 12) samt levering af datamodel og eventuel målarkitektur;

UDKAST

- Opdaterede versioner af de **øvrige bilag**, der måtte have været genstand for ændringer/suppleringer under afklaringsfasen, f.eks. Bilag 10 (Samarbejdsorganisation og Rapportering).

2.2.7 Godkendelse af afklaringsfasen og dennes afslutning (K)

Afklaringsfasen anses for afsluttet, når den endelige afklaringsrapport, inklusive opdaterede tidsplaner, endeligt revideret Leverancebeskrivelse, datamodel og eventuelle øvrige Ændringer til Kontrakten, er godkendt af Kunden.

Kunden skal inden for ti (10) Arbejdsdage efter modtagelse af Leverandørens afklaringsrapport (jf. punkt 2.2.6) skriftligt meddele, om de opdaterede bilag, herunder tids- og aktivitetsplaner og Leverancebeskrivelse og øvrige produkter, kan godkendes.

Såfremt Kunden ikke kan godkende hele eller dele af afklaringsrapporten, skal Leverandøren korrigere og supplere de relevante dele og senest efter 10 Arbejdsdage på ny fremsende dokumenterne til fornyet godkendelse hos Kunden. Kunden skal herefter inden for 5 Arbejdsdage vurdere, om rapporten og/eller Leverancebeskrivelsen kan godkendes.

2.3 Udviklingsfase (N/A)

2.3.1 Formål og igangsættelse (K)

Efter afklaringsfasens afslutning påbegyndes udviklingsfasen. Formålet med denne fase er at udvikle og/eller konfigurere den funktionalitet, som skal implementeres i Systemet i forbindelse med Delleverancen. For den Initiale Leverance er det også i denne fase, at it-miljøerne etableres, som beskrevet i Bilag 6 (Drift), og hvor Systemet installeres på udviklingsmiljøet.

2.3.2 Analyse, Design, Udvikling (K)

Leverandøren skal i udviklingsfasen analysere, designe, udvikle og/eller konfigurere funktionalitet som skal implementeret i Systemet samt internt teste Delleverancen i henhold til den aftalte metode (jf. Kontraktens punkt 6 og Bilag 10.3 (Leverandørens Metoder)) samt God It-skik. Det specificerede System for den pågældende Delleverance er nærmere beskrevet i Bilag 3 (Leverancebeskrivelse).

2.3.3 Etablering af miljøer (K)

Leverandøren skal inden afslutning af udviklingsfasen sikre, at alle relevante miljøer er konfigureret og etableret, således at det udviklede System er klar til test, jf. nærmere punkt 2.4 nedenfor og Bilag 12 (Prøver).

2.3.4 Afslutning af udviklingsfasen (K)

Udviklingsfasen afsluttes når Leverandøren har leveret alt, hvad der i henhold til Bilag 3 og den aftalte tids- og aktivitetsplan skal leveres i udviklingsfasen og Kunden har godkendt Funktionsprøven. Funktionsprøvens procedurer, indhold og godkendelseskriterier er fastsat i Bilag 12 (Prøver). Kundens beføjelser i forbindelse med gennemførelse af Funktionsprøven følger herudover af Kontraktens punkt 7.3, 10 og 11.

UDKAST

2.4 Afprøvningsfase (Ibrugtagning og overtagelse) (N/A)

2.4.1 Formål og igangsættelse (K)

Når udviklingsfasen er gennemført, er Leverandøren klar til at gennemføre afprøvningsfasen. Formålet med afprøvningsfasen er overordnet at få afprøvet Delleverancen ved at gennemføre de påkrævede Prøver, jf. nærmere Bilag 12 (Prøver) samt gennemføre en succesfuld Ibrugtagning af Delleverancen hos Kunden.

2.4.2 Afslutning af afprøvningsfase (K)

Afprøvningsfasen anses for afsluttet, når Leverandøren har gennemført de prøver, der i henhold til Bilag 12 (Prøver) og den detaljerede tids- og aktivitetsplan for den pågældende Delleverance skal udføres i afprøvningsfasen og har bestået Ibrugtagningsprøven, og dette er godkendt af Kunden. Ibrugtagningsprøvens prøver, procedurer, indhold og godkendelseskriterier er fastsat i Bilag 12 (Prøver). Bilag 12 angiver endvidere den nedre grænse for hvilke Fejl, der kan forhindre beståelse af Ibrugtagningsprøven. Kundens beføjelser i forbindelse med gennemførelse af Ibrugtagningsprøven (og overtagelse) følger herudover af Kontraktens punkt 7.4, 10 og 11.

2.5 Implementeringsfase (N/A)

2.5.1 Formål og igangsættelse (K)

Efter Ibrugtagning af det udviklede System indledes implementeringsfasen, hvor det sikres, at det testede System implementeres ved Kunden, herunder installation, puljeopsætning og systemopsætning, eventuel uddannelse (såfremt Kunden har valgt denne option) og afslutning hos de Myndigheder, der er en del af Delleverancen.

2.5.2 Fasens varighed (K)

Implementeringsfasen skal have en minimumsvarighed på 3 måneder, der begynder fra Kundens godkendelse af Ibrugtagningsprøven for Delleverancen.

2.5.3 Fasens varighed (K)

Implementeringsfasen afsluttes med Kundens godkendelse af Driftsprøven for Delleverancen, forudsat at Leverandøren i øvrigt har leveret alt, hvad Leverandøren i henhold til Bilag 3, den detaljerede tids- og aktivitetsplan for den pågældende Delleverance samt krav til Driftsprøven i Bilag 12 (Prøver) skal levere denne fase, og dette er godkendt af Kunden. Kundens beføjelser i forbindelse med gennemførelse af Driftsprøven følger herudover af Kontraktens punkt 7.5, 10 og 11.

2.6 Modifikationer til faserne for de Efterfølgende Delleverancer (N/A)

2.6.1 Indledning (K)

Ved levering af en Efterfølgende Delleverance (dvs. efter den Initiale Leverance) gennemføres der ligeledes en afklarings-, udviklings-, afprøvnings-, og implementeringsfase som beskrevet i punkt 2.2-2.5 med de specifikke modifikationer, der fremgår af dette punkt 2.6.

UDKAST

2.6.2 Afklaringsfasen (K)

Umiddelbart efter Parterne har aftalt at igangsætte en Efterfølgende Delleverance (jf. hovedtidsplanen i punkt 3.2 nedenfor) igangsættes en afklaringsfase, som Parterne skal benytte til bl.a. at drøfte den detaljerede tidsplan for Delleverancen (på baggrund af den overordnede tidsplan i punkt 3.2 nedenfor og Bilag 1.3), udvikling af det specificerede System, (på baggrund af Leverancebeskrivelsen i Bilag 3), opsætning af puljer for de involverede Myndigheder, og samarbejde i øvrigt i forbindelse med Delleverancens faser (udvikling, afprøvning og implementering).

Da ét af formålene med levering af Delleverance 3 og 4 er at udvikle den funktionalitet, der skal understøtte tilkoblingen af (og opsætningen af puljer hos) de Myndigheder, der ikke er del af piloten, er det væsentligt, at afklaring, udvikling, afprøvning og implementering af disse Delleverancer er nøje planlagt, således at Myndighederne omfattet heraf kan publicere ordninger og puljer på nærmere planlagte tidspunkter (f.eks. ved årsskiftet).

Det dog forventes, at materialet i afklaringsrapporten for en Efterfølgende Delleverance vil være mindre omfattende og primært bestå af en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den pågældende Delleverance samt sådanne afklaringer der er relevante for at påbegynde udvikling, afprøvning og implementeringsfasen for den pågældende Delleverance.

2.6.3 Udvikling (K)

Leverandøren udvikler løsningen med udgangspunkt i Leverancebeskrivelsen i Bilag 3 og som beskrevet under punkt 2.3 ovenfor. De Efterfølgende Delleverancer kan udvikles parallelt, hvis det er hensigtsmæssigt af hensyn til at Myndighederne indenfor den pågældende Delleverance er tilkoblet Systemet og kan begynde puljeopsætning i god tid inden, at Myndighederne forventes at oprette ordninger og puljer (f.eks. i god tid inden et årsskifte).

UDKAST

3 HOVEDTIDSPLAN FOR LEVERANCEN (N/A)

3.1 Hovedtidsplan for Initial Leverance (K)

Dette punkt 3.1 indeholder hovedtidsplanen og betalingsmilepæle for den Initiale Leverance på tidspunktet for Kontraktens indgåelse. Denne hovedtidsplan er nærmere uddybet i den detaljerede aktivitetsplan for afklaringsfasen for den Initiale Leverance i Bilag 1.1 og den detaljerede tids- og aktivitetsplan for hele den Initiale Leverance i Bilag 1.2.

*[**Vejledning til tilbudsgiver:***
Tilbudsgiver skal indsætte forslag til en hovedtidsplan for den Initiale Leverance på de gule felter i tabel 1 nedenfor på baggrund af (i) Kundens forventninger til den overordnede tidsplan vist i Figur 1 ovenfor, (ii) kravene til de enkelte faser beskrevet i punkt 2 ovenfor, (iii) Leverancebeskrivelsen i Bilag 3 (Leverancebeskrivelse), (iv) omfanget af Kundens medvirken beskrevet i Bilag 10 (Samarbejdsorganisation og rapportering) samt 5) Leverandørens erfaringer fra tidligere gennemførte projekter og Leverandørens kompetencer.]

Tabel 1. Hovedtidsplan for Initial Leverance

Milepæle og vigtigste aktiviteter	Startdato	Slutdato	Betalings- og bodsmilepæl
Forventet kontraktindgåelse	16. oktober 2020		
Afklaringsfasen			
Påbegyndelse af afklaringsfasen	*[**Indsættes af tilbudsgiver**]*	*[**Indsættes af tilbudsgiver**]*	
Godkendt afklaringsrapport	*[**Indsættes af tilbudsgiver**]*	*[**Indsættes af tilbudsgiver.** Bemærk at der skal afsættes fornøden tid til godkendelse, jf. kravene i punkt 2.2 ovenfor]*	X
Udviklingsfasen			
Bestået Funktionsprøve	*[**Indsættes af tilbudsgiver**]*	*[**Indsættes af tilbudsgiver**]*	X
Afprøvningsfase			
Bestået Ibrugtagningsprøve (Overtagelsesdag)	*[**Indsættes af tilbudsgiver**]*	*[**Indsættes af tilbudsgiver.** Bemærk, at udstrækningen af testfasen skal tage højde for, at der afsættes fornøden tid til at gennemføre de specificerede prøver i henhold til bl.a. Bilag 12 samt foretages særskilt godkendelse af dokumentation.]*	X
Implementeringsfase			

Tilkobling af Pilot-Myndigheder (jf. figur 1) samt bestået Driftsprøve	Datoen for bestået Ibrugtagningsprøve	Datoen for bestået Driftsprøve (mindst 3 måneder efter datoen for bestået Ibrugtagningsprøve) [*Vejledning til Tilbudsgiver: De tre måneder i implementeringsfasen benyttes til opsætning af puljer og uddannelse af Kundens medarbejdere. Fasen kan ikke afkortes af Tilbudsgiver*]	X

3.2 Hovedtidsplan for Efterfølgende Delleverancer (K)

Dette punkt 3.2 indeholder hovedtidsplanen for de Efterfølgende Delleverancer på tidspunktet for Kontraktens indgåelse. Denne hovedtidsplan er nærmere uddybet i den overordnede tids- og aktivitetsplan for de Efterfølgende Delleverancer i Bilag 1.3.

Leverandøren er under Leveranceprojektet ansvarlig for løbende og rettidig udarbejdelse af detaljerede tidsplaner for hver Efterfølgende Delleverance indenfor rammerne af hovedtidsplanen nedenfor og den overordnede tidsplan i Bilag 1.3.

*[**Vejledning til tilbudsgiver:***
Tilbudsgiver skal indsætte forslag til en hovedtidsplan for de Efterfølgende Delleverancer på de gule felter i tabel 2 nedenfor på baggrund af (i) Kundens forventninger til den overordnede tidsplan vist i Figur 1 ovenfor, (ii) kravene til de enkelte faser beskrevet i punkt 2 ovenfor, (iii) Leverancebeskrivelsen i Bilag 3 (Leverancebeskrivelse), (iv) omfanget af Kundens medvirken beskrevet i Bilag 10 (Samarbejdsorganisation og rapportering) samt 5) Leverandørens erfaringer fra tidligere gennemførte projekter og Leverandørens kompetencer.]

Tabel 2. Hovedtidsplan for Delleverancer

	Delleverance 2		Delleverance 3		Delleverance 4		
Milepæle og vigtige aktiviteter	**Start dato**	**Slut dato**	**Start dato**	**Slut dato**	**Start dato**	**Slut dato**	**Betaling- og bodsmile pæle**
Afklaringsfase							
Påbegyndelse af afklaringsfase	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	
Godkendt afklaringsrapport	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	
Udviklingsfase							
Bestået Funktionsprøve	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	X

Afprøvningsfase							
Bestået Ibrugtagningsprøve (Overtagelsesdag)	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	X
Implementerings-fase							
Tilkobling af Myndigheder samt bestået Driftsprøve	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	X
Endelig Overtagelse							
Bestået Driftsprøve af den sidste Delleverance	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	[Indsættes af tilbudsgiver]	X

4 OPTIONER

Kunden har en option på at tilkøbe uddannelse som led i en Delleverances udførelse. Dette skal ske med et varsel på [*INDSÆTTES*] uger inden den afholdte uddannelse og omfatte de i Bilag 3 (Leverancebeskrivelse) nævnte opgaver til den i Bilag 11.1 (Specifikation af Priser) anførte optionspris.

UDKAST
